

FRAMING HAND-OFF SHEET · HOJA DE ENTREGA — ENMARCADO DE MUROS


The Breakfast Spot — Interior Wall Framing / Enmarcado de Muros Interiores

PROJECT / PROYECTO The Breakfast Spot	ADDRESS / DIRECCIÓN 338 E. 8th Ave, Homestead, PA 15120	DRAWINGS / PLANOS A1-1 Plan · A5-1 Wall Types · A4-1 Restrooms	DATE / FECHA 2026-09-17
--	---	--	----------------------------

⚠ READ FIRST / LEER PRIMERO

EN: Build all walls to the architect's STAMPED plans. Wall types below are from sheet A5-1. Snap all wall lines on the slab and get GC sign-off BEFORE standing any wall. Verify every dimension in the field. Do NOT close/cover any wall until the plumbing and electrical trades and the GC have inspected it.

ES: Construya todos los muros según los planos SELLADOS del arquitecto. Los tipos de muro de abajo son de la hoja A5-1. Marque todas las líneas de muros en el piso y obtenga la aprobación del contratista ANTES de levantar cualquier muro. Verifique cada medida en el sitio. NO cierre/cubra ningún muro hasta que los oficios de plomería y electricidad y el contratista lo hayan inspeccionado.

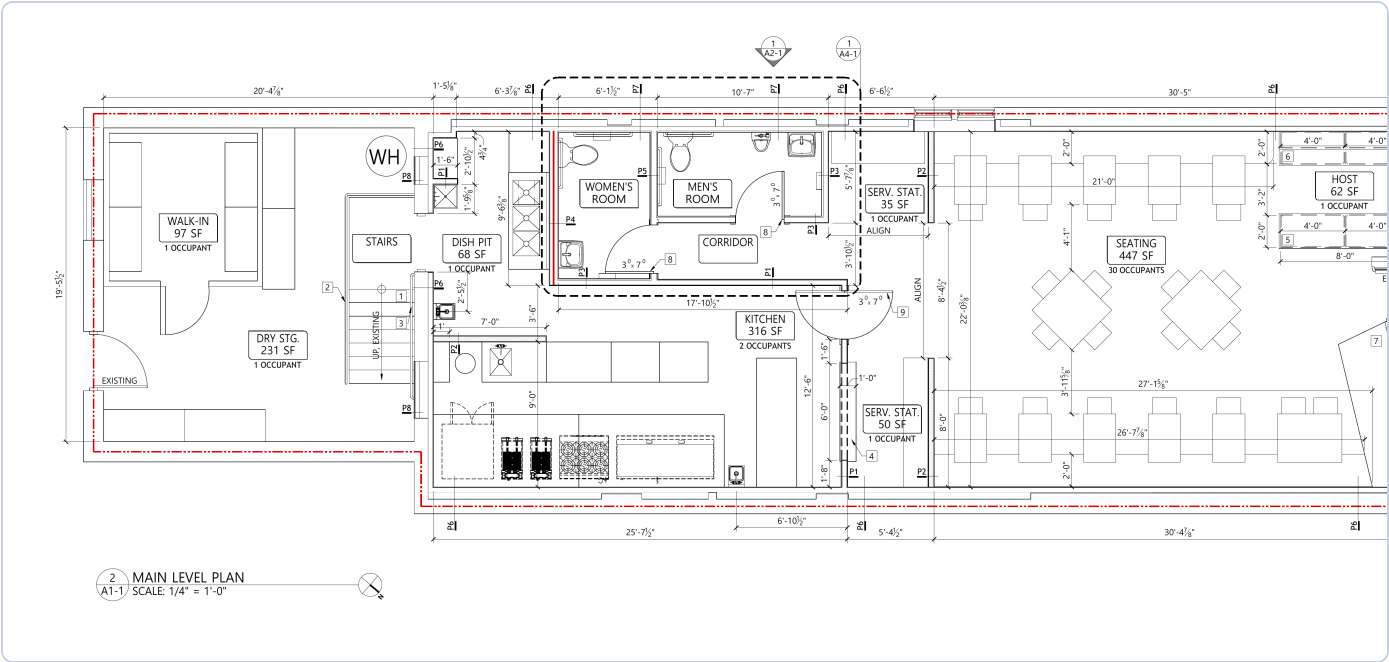

A1-1 Main Level Plan · Front/entrance = right (8th Avenue) · Back-of-house = left · Entrada = derecha · Área de servicio = izquierda

1 · WALL-TYPE SCHEDULE (FROM A5-1) / TABLA DE TIPOS DE MURO

TYPE TIPO	THICK. GROSOR	FRAMING / ENMARCADO	HEIGHT & TOP / ALTURA Y REMATE	FINISH / ACABADO
P1	4½"	2×4 wood studs @ 16" o.c. <i>Montantes 2×4 de madera @ 16"</i>	Full height — extend to underside of existing ceiling <i>Altura completa — hasta el techo existente</i>	½" GWB paint or FRP, both sides <i>Panel de yeso ½" ambos lados</i>
P2	4½"	2×4 wood studs @ 16" o.c. <i>Montantes 2×4 @ 16"</i>	PARTIAL / half-wall — capped with painted 1×6 (counter height, ~3'-0" AFF)	½" GWB paint or FRP, both sides <i>Panel de yeso ½" ambos lados</i>

TYPE TIPO	THICK. GROSOR	FRAMING / ENMARCADO	HEIGHT & TOP / ALTURA Y REMATE	FINISH / ACABADO
			<i>MEDIA ALTURA — rematado con 1×6 pintado (~3'-0")</i>	
P3	5"	2×4 wood studs @ 16" o.c. <i>Montantes 2×4 @ 16"</i>	Full height — to underside of existing ceiling <i>Altura completa</i>	½" GWB paint 1 side; TILE on ¼" thinset to 4' min AFF + cove base other side <i>Azulejo hasta 4' un lado (muro húmedo)</i>
P4	7"	2×4 wood studs @ 16" o.c. (deep plumbing / chase wall) <i>Muro grueso para plomería</i>	Full height — to underside of existing ceiling <i>Altura completa</i>	½" GWB FRP; TILE to 4' min AFF + cove base <i>Azulejo hasta 4' (muro húmedo)</i>
P5	5½"	2×4 wood studs @ 16" o.c. <i>Montantes 2×4 @ 16"</i>	Full height — to underside of existing ceiling <i>Altura completa</i>	½" GWB paint 1 side; TILE to 4' min AFF + cove base other side <i>Azulejo hasta 4' (muro húmedo)</i>
P6	4"	2×4 wood studs @ 16" o.c., furred against existing masonry <i>Emplantillado contra mampostería existente</i>	Full height — to underside of existing ceiling <i>Altura completa</i>	½" GWB paint or RFP <i>Panel de yeso ½"</i>
P7	4½"	2×4 wood studs @ 16" o.c., furred against existing masonry <i>Emplantillado contra mampostería</i>	Full height — to underside of existing ceiling <i>Altura completa</i>	½" GWB paint or RFP; TILE to 4' min AFF + cove base <i>Azulejo hasta 4' (húmedo)</i>
P8	4"	2×4 wood studs @ 16" o.c., furr-out box with wall type P6 on existing masonry <i>Caja/emplantillado con tipo P6</i>	Per detail <i>Según detalle</i>	½" GWB paint or RFP <i>Panel de yeso ½"</i>

Blue rows = wet walls (tile to 4' AFF), coordinate with plumber. · Filas azules = muros húmedos (azulejo hasta 4'), coordinar con plomero.
Acoustical sealant at all edges of every wall. · Sellador acústico en todos los bordes.

2 · ROOMS & WHICH WALL TYPE / CUARTOS Y TIPO DE MURO

AREA / ÁREA	KEY SIZE (VERIFY) / MEDIDA CLAVE (VERIFICAR)	WALL TYPE / TIPO	OPENINGS / ABERTURAS
Host / Entry — <i>Anfitrión / Entrada</i>	62 SF · entry bench 8'-0" each side · host opening 3'-2"	Casework (not framing) <i>Carpintería</i>	Existing storefront entry <i>Entrada existente</i>
Dining / Seating — <i>Comedor</i>	447 SF · run 30'-5" · banquettes 21'-0" & 26'-7⅞" · aisle 4'-1"	P6 furring on existing walls <i>Emplantillado</i>	—
Service stations — <i>Estaciones de servicio</i>	35 SF & 50 SF · ~8'-0" / 8'-4½"	P2 half-wall + counter <i>Media pared</i>	Open counter / pass <i>Mostrador / pase</i>
Kitchen — <i>Cocina</i>	316 SF · front wall 17'-10½" · depth 12'-6"	P1 + P2 half-wall pass <i>Media pared de pase</i>	1 door 3'-0"×7'-0" · expo pass window (head 7'-0" AFF) <i>1 puerta · ventana de pase</i>
Corridor — <i>Pasillo</i>	within 10'-7" run · depth 3'-10½"	P1 / P3	1 door 3'-0"×7'-0" <i>1 puerta</i>
Women's Room — <i>Baño Mujeres</i>	~6'-1½" wide · depth ~5'-7⅞"	P4 chase · P5 · P7	1 door 3'-0"×7'-0" <i>1 puerta</i>
Men's Room — <i>Baño Hombres</i>	within 10'-7" run · depth ~5'-7⅞"	P3 / P5 / P7	1 door 3'-0"×7'-0" <i>1 puerta</i>
Dish Pit — <i>Área de lavado</i>	68 SF	P6 (wet area) <i>área húmeda</i>	Open <i>Abierto</i>

AREA / ÁREA	KEY SIZE (VERIFY) / MEDIDA CLAVE (VERIFICAR)	WALL TYPE / TIPO	OPENINGS / ABERTURAS
Stairs — <i>Escaleras</i>	EXISTING — do not frame <i>EXISTENTE — no enmarcar</i>	—	—
Dry Storage — <i>Almacén seco</i>	231 SF	P1 / P6	1 door <i>1 puerta</i>
Walk-in Cooler — <i>Cámara fría</i>	97 SF	Prefab panels — COORDINATE, usually NOT framed <i>Prefabricado — NO se enmarca</i>	Cooler door <i>Puerta de cámara</i>
Water Heater closet — <i>Clóset calentador</i>	~1'-6" × 2'-10½"	P1 / P6 / P8	Access <i>Acceso</i>

3 · GENERAL FRAMING NOTES / NOTAS GENERALES DE ENMARCADO

All partitions are 2×4 wood studs @ 16" on center. Full-height walls (P1, P3, P4, P5, P6, P7) extend to the underside of the existing ceiling/structure above.

Todos los muros son montantes 2×4 de madera @ 16" al centro. Los muros de altura completa (P1, P3, P4, P5, P6, P7) llegan hasta el techo/estructura existente.

P2 walls are HALF-HEIGHT (counter height, ~3'-0"), capped with a painted 1×6. These are the service-station and kitchen-pass half walls. Do not run them to the ceiling.

Los muros P2 son de MEDIA ALTURA (~3'-0"), rematados con 1×6 pintado. Son las medias paredes de estaciones de servicio y del pase de cocina. No los suba al techo.

Kitchen expo pass: half-wall (P2) with countertop at 3'-0" AFF; pass-window head at 7'-0" AFF; counter ~1'-0" deep. See A5-1 detail 3.

Pase de cocina: media pared (P2) con mostrador a 3'-0"; cabezal de ventana de pase a 7'-0"; mostrador ~1'-0" de fondo. Ver detalle 3 de A5-1.

Furring walls P6/P8 are built tight against the existing masonry. P4 is a 7" deep plumbing/chase wall — coordinate the chase with the plumber.

Los muros de emplantillado P6/P8 se construyen pegados a la mampostería existente. P4 es un muro grueso de 7" para plomería — coordine con el plomero.

Door openings: frame with DOUBLE 2×4 stud jambs and a double-2×4 header, wood frame painted, per A5-1 door details. All doors are 3'-0"×7'-0". Confirm swing on the plan.

Aberturas de puertas: enmarque con montantes DOBLES 2×4 en las jambas y cabezal doble 2×4, marco de madera pintado, según detalles de A5-1. Todas las puertas son 3'-0"×7'-0". Confirme el sentido en el plano.

WET WALLS (P3, P4, P5, P7): tile goes on ¼" thinset to 4'-0" min above floor with cove base. Keep studs straight/plumb for tile. Do not cover until plumbing rough-in is inspected.

MUROS HÚMEDOS (P3, P4, P5, P7): azulejo sobre thinset de ¼" hasta 4'-0" mínimo con zócalo. Mantenga montantes rectos/a plomo para el azulejo. No cubra hasta inspección de plomería.

Install solid blocking in walls for: restroom grab bars (per A4-1, approx 33"–36" AFF, verify), wall-hung lavatories, banquettes, wall shelving, and the expo/service counters.

Instale bloqueo sólido para: barras de apoyo (según A4-1, aprox 33"–36", verificar), lavabos de pared, bancas, repisas y mostradores de servicio.

Apply acoustical sealant at all edges of every wall (top, bottom, sides). Fasten plates to slab and structure per code.

Aplique sellador acústico en todos los bordes de cada muro. Fije las soleras al piso y a la estructura según el código.

4 · VERIFY IN FIELD BEFORE FRAMING / VERIFICAR ANTES DE ENMARCAR

Confirm all dimensions against the full-size stamped A1-1 plan (sizes here are read from a reduced copy).

Confirme todas las medidas con el plano A1-1 sellado a tamaño completo (las medidas aquí son de una copia reducida).

Confirm door swings and exact rough openings from the plan / door schedule.

Confirme el sentido de apertura y las aberturas exactas en el plano / programa de puertas.

Coordinate pipe, panel and box locations inside walls with plumber (P2-1) and electrician (E2-1) before closing.

Coordine tuberías, tableros y cajas dentro de los muros con el plomero (P2-1) y electricista (E2-1) antes de cerrar.

Confirm exact grab-bar blocking heights on the A4-1 restroom elevations.

Confirme las alturas exactas de bloqueo de barras en las elevaciones de baños A4-1.

5 · PRE-START CHECKLIST / LISTA ANTES DE EMPEZAR

- ☐ Stamped plans A1-1 + A5-1 on site
Planos sellados A1-1 + A5-1 en el sitio
- ☐ All wall lines snapped on slab, checked vs plan
Líneas de muros marcadas en el piso y revisadas
- ☐ GC approved layout before standing walls
Contratista aprobó el trazo antes de levantar
- ☐ 2×4 studs / plates on hand; correct wall thickness per type
Montantes 2×4 y soleras listos; grosor correcto por tipo
- ☐ P2 half-walls marked at counter height (~3'-0")
Medias paredes P2 marcadas a altura de mostrador (~3'-0")
- ☐ Door openings marked — double 2×4 jambs, 3'-0"×7'-0"
Aberturas marcadas — jambas dobles 2×4, 3'-0"×7'-0"
- ☐ Blocking marked (grab bars, lavatories, banquettes, shelving, counters)
Bloqueo marcado (barras, lavabos, bancas, repisas, mostradores)
- ☐ Plumber/electrician coordinated on wet & chase walls (P3/P4/P5/P7)
Plomero/electricista coordinados en muros húmedos y ductos

Framing lead / Jefe de enmarcado

GC approval / Aprobación GC

Date / Fecha

Field aid — build to the stamped construction documents (A1-1, A4-1, A5-1). Dimensions marked "verify" must be confirmed against the full-size stamped drawings. · Ayuda de campo — construya según los documentos sellados. Las medidas "verificar" deben confirmarse con los planos sellados a tamaño completo.
